현대정밀 자재 창고 관리 플랫폼

프로젝트 이름	**현대정밀 자재 창고 관리 플랫폼 프로젝트**
프로젝트 담당자	양은영, 안수경, 신재구, 이현민
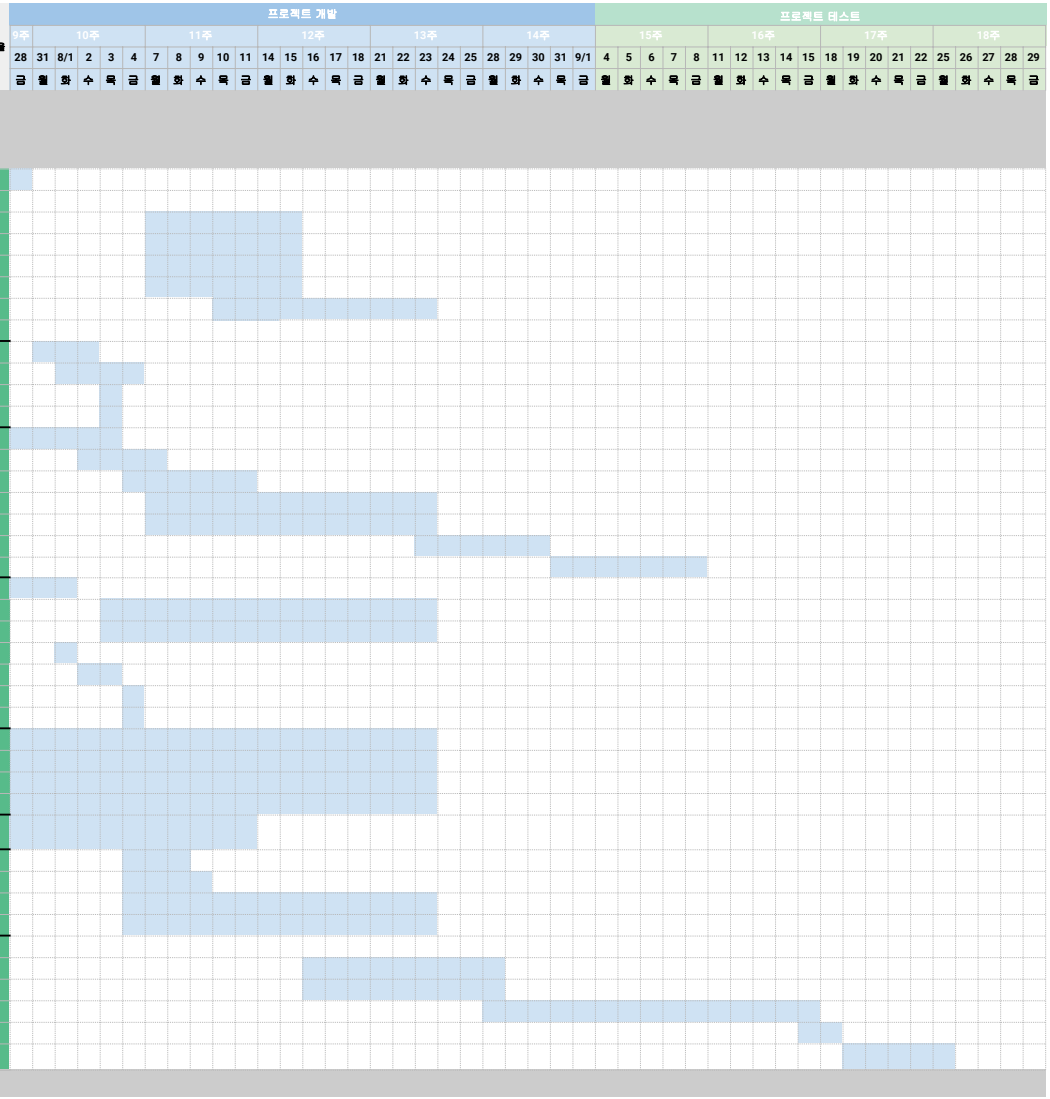
WBS 번호		작업 제목	담당자	시작일	마감일	기간	작업 완료 비율
1		**프로젝트 정의 및 계획(6/1~)**					
2		**프로젝트 설계(~7/7)**					
3		**프로젝트 개발(7/24~9/13)**					
3.1		개발환경 구축	양은영,안수경,신재구,이현민	23년 7월 28일	23년 7월 28일	1	100%
개발				23년 7월 28일	23년 9월 1일	33	98%
3.2.1	입고페이지	부품명을 통한 입고 리스트 개별 추가	양은영	23년 8월 7일	23년 8월 15일	8	100%
3.2.2		입고 일괄 등록	양은영	23년 8월 7일	23년 8월 15일	8	100%
3.2.3		입고 양식 다운로드	양은영	23년 8월 7일	23년 8월 15일	8	100%
3.2.4		입고 리스트 선택 삭제	안수경	23년 8월 7일	23년 8월 15일	8	100%
3.2.5		입고 실시간 검색 기능	안수경	23년 9월 8일	23년 9월 11일	3	100%
3.2.6		입고 처리 기능	양은영	23년 8월 10일	23년 8월 23일	13	100%
3.3.1	리스트 조회 페이지	Rack번호 및 품번 조회	안수경	23년 7월 31일	23년 8월 2일	2	100%
3.3.2		일괄 검색	안수경	23년 8월 2일	23년 8월 6일	4	100%
3.3.3		조회 양식 다운로드	안수경	23년 8월 3일	23년 8월 3일	0	100%
3.3.5		검색 리스트 다운로드	안수경	23년 8월 3일	23년 8월 3일	0	100%
3.4.1	리스트 상세 페이지	조회되는 Rack 선택 및 변경	이현민	23년 7월 28일	23년 8월 3일	5	100%
3.4.2		해당 Rack 리스트 출력	이현민	23년 8월 2일	23년 8월 4일	2	100%
3.4.3		부품 적재 여부	이현민	23년 8월 4일	23년 8월 4일	0	100%
3.4.4		개별 부품 정보 확인창	이현민	23년 8월 7일	23년 8월 23일	16	100%
3.4.5		카테고리 별 색상 출력	이현민	23년 8월 7일	23년 8월 23일	16	100%
3.4.6		구매 템플릿에의 UI 재배치	이현민	23년 8월 23일	23년 8월 30일	7	100%
3.4.7	입-출고페이지	필요 영역에 대한 print 기능	이현민	23년 8월 31일	23년 9월 8일	8	100%
3.5.1	출고페이지	출고 등록 (품번 오열영 바코드 입력)	양은영	23년 7월 28일	23년 8월 1일	3	100%
3.5.2		출고 등록 > 화면에 영역 표시	양은영	23년 8월 3일	23년 8월 23일	20	100%
3.5.3		출고 일괄 등록	양은영	23년 8월 3일	23년 8월 23일	20	100%
3.5.4		출고 양식 다운로드	양은영	23년 8월 1일	23년 8월 1일	0	100%
3.5.5		출고 처리 기능	양은영	23년 8월 2일	23년 8월 3일	1	100%
3.5.6		전체 화면 출력	양은영	23년 8월 4일	23년 8월 4일	0	100%
3.5.7		출력 항목 변경 및 내부 script 변경	이현민	23년 9월 8일	23년 9월 12일	4	100%
3.6.1	모니터링 페이지	Rack 화면 출력 (전체, Rack별, 분류별, 위치)	신재구	23년 7월 28일	23년 8월 14일	16	100%
3.6.2		Rack 영역표시 (Rack별, 분류별, 위치)	신재구	23년 7월 28일	23년 8월 14일	16	100%
3.6.3		Rack 현황 정보 패널(Rack별, 분류별)	신재구	23년 7월 28일	23년 8월 14일	16	100%
3.6.4		Rack 검색 정보 패널(셀정보, 셀모달, 검색)	신재구	23년 7월 28일	23년 8월 14일	16	100%
3.7.1	카테고리 수정 페이지	Rack 정보 수정 패널(카테고리 추가, 수정)	신재구	23년 7월 28일	23년 8월 14일	16	100%
3.8.1	제품 페이지	부품 개별 등록 및 일괄등록	안수경	23년 8월 4일	23년 8월 8일	4	100%
3.8.2		부품 수정	안수경	23년 8월 4일	23년 8월 9일	5	100%
3.8.3		부품 삭제	안수경	23년 8월 4일	23년 8월 23일	19	100%
3.8.4		부품 다중 검색 및 유효성 체크	안수경	23년 8월 4일	23년 8월 23일	19	100%
기능 및 디자인 수정				23년 8월 16일	23년 8월 28일	12	100%
3.9.1		기능 추가 보완	양은영,안수경,신재구,이현민	23년 8월 16일	23년 8월 28일	12	100%
3.9.2		디자인 수정(부트스트랩 적용)	양은영,안수경,신재구,이현민	23년 8월 16일	23년 9월 4일	18	100%
3.9.3		피드백 사항 추가 보완	양은영,안수경,신재구,이현민	23년 8월 28일	23년 9월 15일	17	100%
3.9.4		디버깅 및 문서작업	양은영,안수경,신재구,이현민	23년 9월 15일	23년 9월 18일	3	100%
3.9.5		완료보고 이후 피드백 사항 추가 보완	안수경,이현민	23년 9월 19일	23년 9월 25일	6	100%
5		**프로젝트 테스트 및 발표(9/1~9/27)**
